Zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky - Horný Vadičov															
Pracovný úkon	Čas	1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	6.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň	10.týždeň	11.týždeň	12.týždeň	13.týždeň	14 týždeň
Zariadenie staveniska	5.dni														
Zateplenie fasády															
Montáž fasádneho lešenia	3.dni														
Demonáž pôvodného zatepľovacieho systému	3.dni														
Montáž ochranných sieti na lešení	1.deň														
Zakrývanie okenných a dverových otvorov	2.dni														
Otlčenie nesúdržnej omietky	1.deň														
Vyspravenie otlčenej omietky	3.dni														
Montáž štartovacích líšt	1.deň														
Demontáž strišok nad vstupmi	1.deň														
Demontáž parapetov	1.deň														
Montáž zatepľovacieho systému	10.dni														
Montáž ukončovacích prvkov fasády (rohovníky atď.)	3.dni														
Montáž parapetov	2.dni														
Kotvenie zatepľovacieho systému	1.deň														
Sitovanie fasády	3.dni														
Penetrovanie fasády	1.deň														
Aplikácia fasádnej omietky	4.dni														
Montáž strešnej krytiny nad vstupmi	3.dni														
Demontáž ochranných sieti na lešení	1.deň														
Demontáž fasádneho lešenia	3.dni														
Zateplenie základov, sokla															
Rozobratie pôvodnej zamkovej dlažby	2.dni														
Čistenie rozobratej zamkovej dlažby	3.dni														
Odstránenie štrkových podkladov s pod zamkovej dlažby	3.dni														
Odkop základov	3.dni														
Demontáž pôvodnej zvislej hydroizolácie	3.dni														
Otlčenie nesúdržnej omietky	2.dni														
Vyspravenie otlčenej omietky	1.deň														
Násyp podkladu pod drenáž	2.dni														
Montáž drenáže	1.deň														
Obsypanie drenáže	2.dni														
Aplikácia zvislej stierky hydrizolačnej vrstvy	2.dni														
Montáž zatepľovacieho systému základov	3.dni														
Montáž nopovej fólie	1.deň														
Spätný zásyp ryhy s hutnením	1.deň														
Výkop ryhy pre parkové obrubníky	2.dni														
Osadenie parkových obrubníkov	3.dni														
Násyp štrkopieskovýh podkladov pod chodníky	1.deň														
Montáž zatepľovacieho systému sokla	3.dni														
Kotvenie zatepľovacieho systému sokla	1.deň														
Sitovanie sokla	2.dni														
Penetrácia sokla	1.deň														
Aplikácia soklovej omietky	3.dni														
Násyp cementovej stabilizácie pod chodníky	2.dni														
Montáž zamkovej dlažby do chodníkov	5.dni														
Montáž ext. keramickej dlažby	3.dni														
Montáž kovového ext. zábradlia	2.dni														
Zateplenie strešneho plášťa															
Demontáž pôvodnej strešnej krytiny	5.dni														
Demontáž pôvodnych kontralat	2.dni														
Montáž kontralat	3.dni														
Montáž konštrukcie pre poddašie	3.dni														
Montáž plného debnenia z OSB	4.dni														
Montáž poistnej hydroizolácie	1.deň														
Montáž klampiarskych prvkov strechy	1.deň														
Montáž novej strešnej krytiny	6.dni														
Montáž tepelnej izolácie stropov	2.dni														
Zateplenie poddašia	2.dni														
Nasitovanie poddašia	3.dni														
Penetrácia poddašia	1.deň														
Aplikácia fasádnej omietky poddašia	1.deň														
Montáž ríňového systému strechy	1.deň														

Výmena otvorových konštrukcií	
Demontáž interiérových okenných parapetov	5.dni
Osekanie vnútorných ostení	2.dni
Demontáž otvorových konštrukcií	5.dni
Vyspravenie vnútorných ostení	3.dni
Osadenie nových otvorových výplní	7.dni
Montáž int.parapetov okien	2.dni
Vykurovanie	
Demontáž pôvodného vykurovacieho systému	3.dni
Montáž nového vykurovacieho sytému	8.dni
Systém prípravy teplej vody	
Montáž rozvodu systému teplej vody	3.dni
Stavebné úpravy pre zvýšenie kvality int.prostredia	
Zvesenie interiérových dverí	1.deň
Búranie keramických obkladov	2.dni
Odstránenie povlakových krytín PVC	2.dni
Búranie dlažieb a pôvodných poterov	5.dni
Vyspravenie omietok po búrani obkladov	3.dni
Aplikácia penetrácie pre vnútorné omietky	2.dni
Aplikácia vnútorných omietok	10.dni
Aplikácia hydrizolačnej stierky	2.dni
Montáž poterov	3.dni
Liatie samonivelizačných stierok	2.dni
Montáž keramických obkladov	5.dni
Montáž keramických dlažieb	10.dni
Penetrácja stien pred maľovaním	2.dni
Maľovanie stien interiéru	5.dni
Náter kovových prvkov	3.dni
Montáž povlakových krytín PVC	5.dni
Položenie kobercov	2.dni
Zdravotechnika	
Montáž rozvodov zdravotechniky	15.dni
Kompletáž zdravotechniky	3.dni
Bleskozvod	
Montáž bleskozvodu	2.dni
Uzemnenie	
Montáž uzemnenia	3.dni
Debarierizačné opatrenie	
Montáž plošiny pre dvojramenné schodisko	2.dni
Plynový kotol	
Demontáž pôvodného plynového zariadenia	5.dni
Montáž plynového kotla s príslušenstvom	5.dni
Odstránenie zariadenia staveniska	2.dni

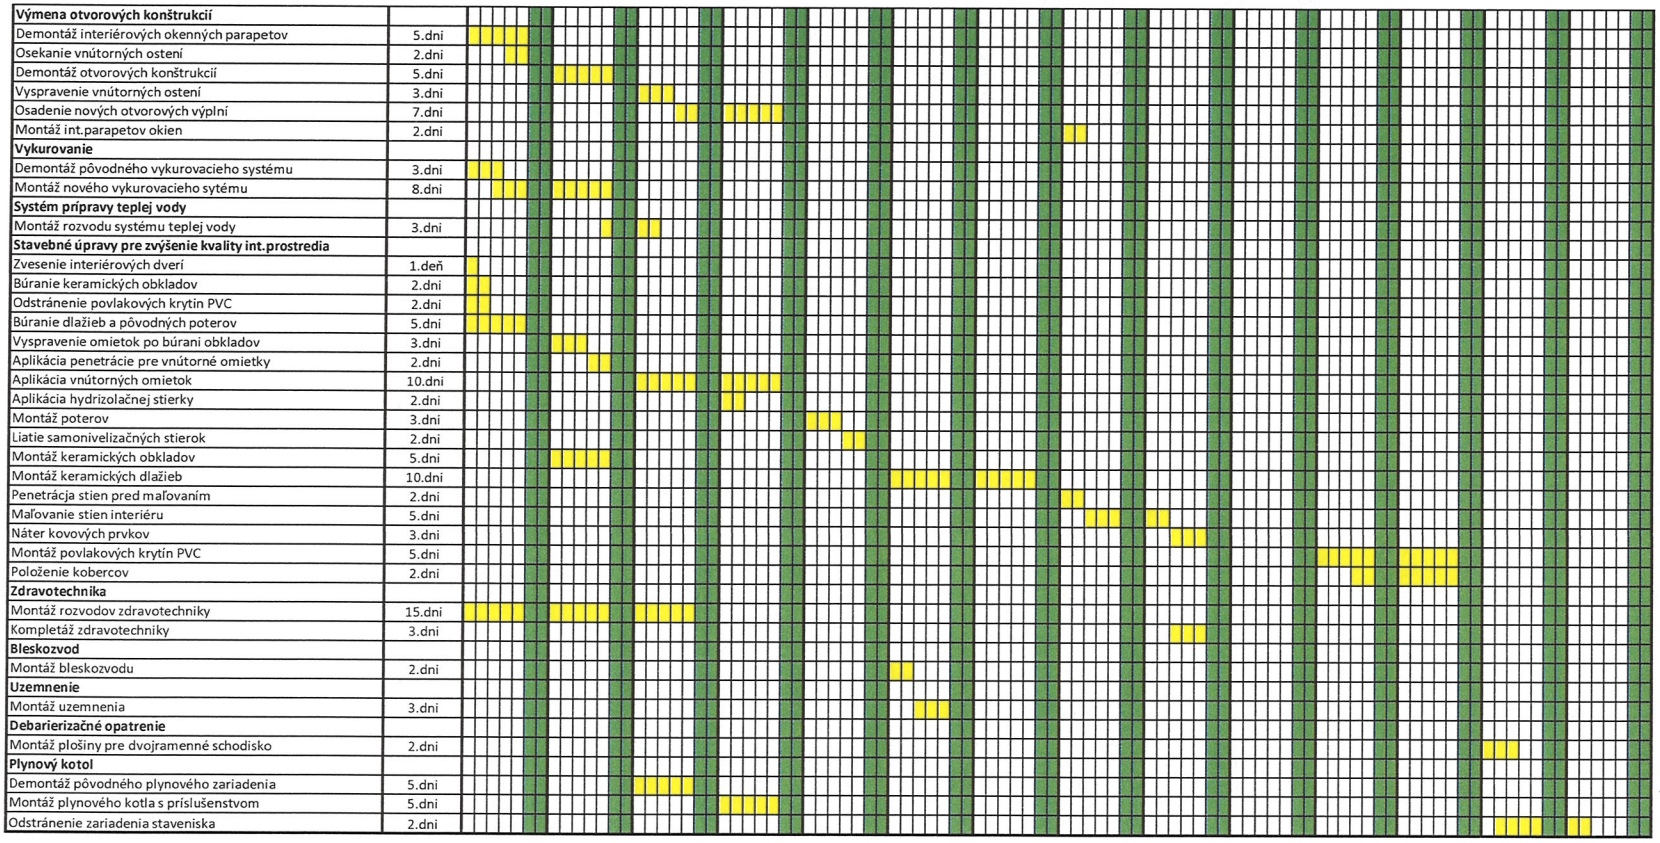

Celkova dĺžka realizácie diela 93 kalendárnych dní, 67 pracovných dni.

REAL I[redacted]na, s.r.o.
013 0[redacted]9 Váhom
IČ D[redacted]2
6340
